Cronograma de sprints · Guía digital La Merced

Oct 22, 2026 · @Martin

Resumen


La fachada central se entrega en 5 sprints de desarrollo (del 2 al 6), de dos semanas cada uno, entre el 13 de octubre de 2026 y el 8 de febrero de 2027. Los Sprints 2 a 4 van de octubre a noviembre, diciembre queda libre y los Sprints 5 y 6 se hacen desde la segunda semana de enero. Cada sprint cierra un lunes y el siguiente arranca el martes.

Cada sprint tiene cuatro bloques que avanzan en paralelo, uno por integrante, con 20 horas por persona (80 horas por sprint, 400 en total). El Sprint 1 (investigación y propuesta) ya terminó: fue del 8 de septiembre al 9 de octubre.

Diagrama de Gantt

La fachada central se entrega el 8 de febrero de 2027, con diciembre libre

2026–2027 · barra ancha: sprint · barra fina: bloque · rombo: entrega de la URL

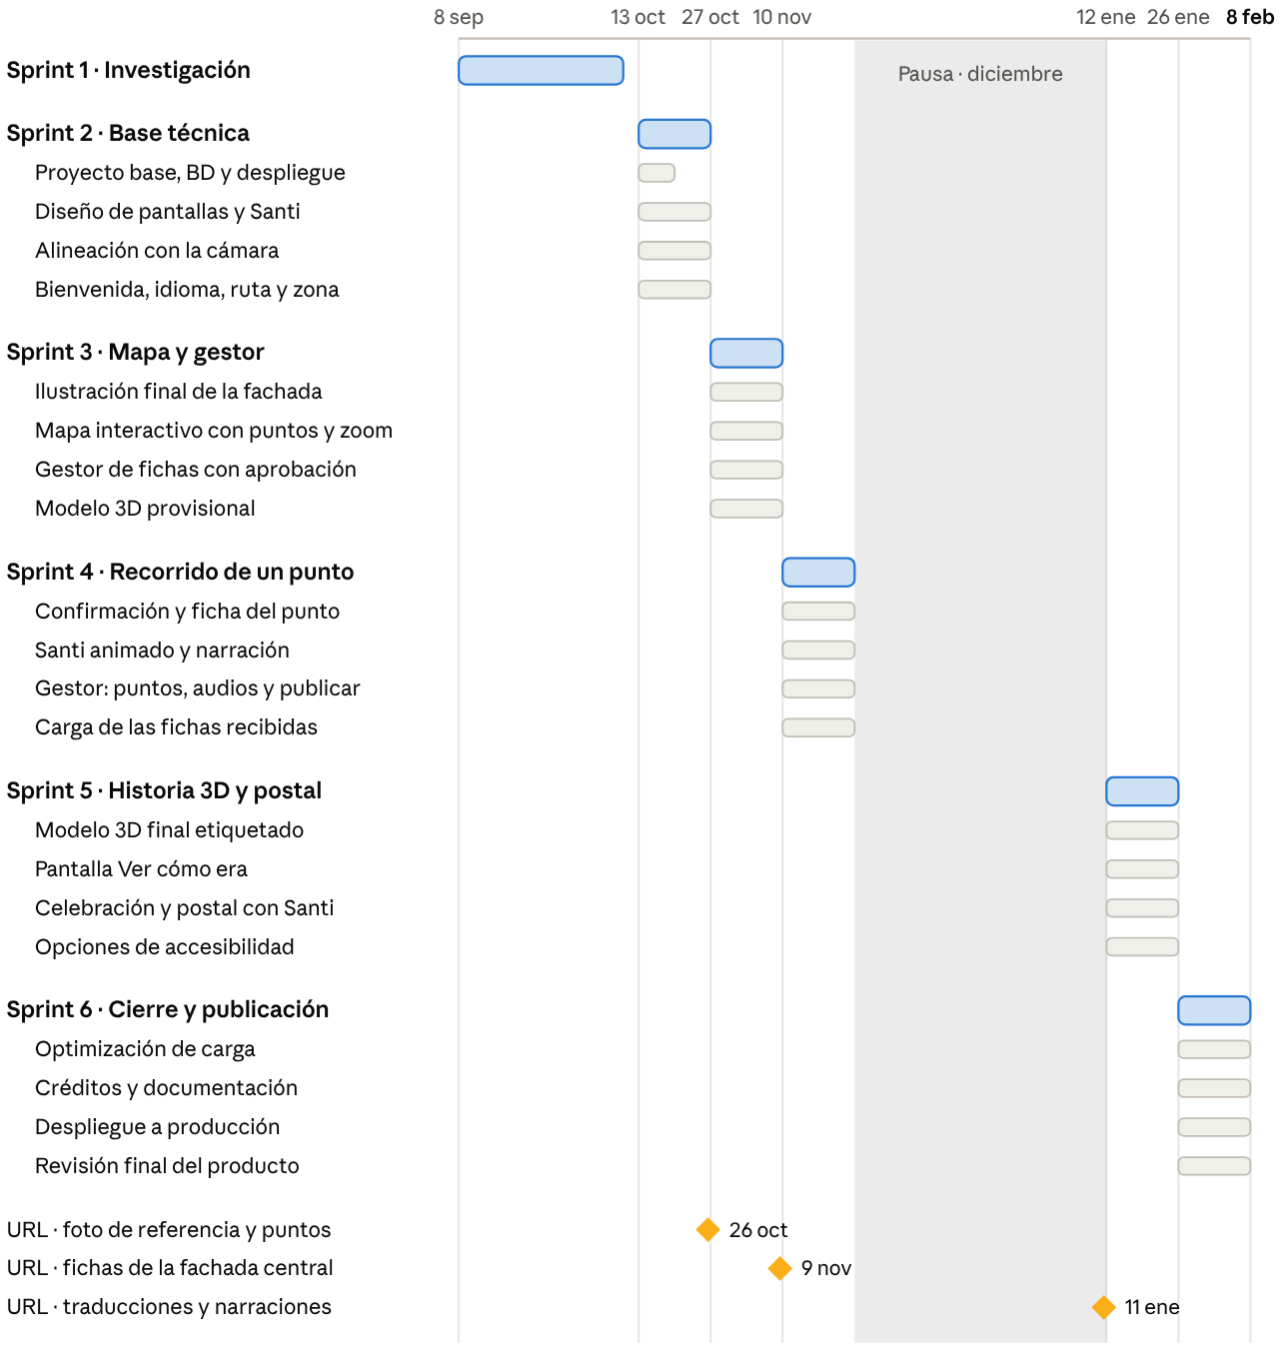

Gantt · 6 sprints, 20 bloques y 3 entregas de la URL

Los cuatro bloques de cada sprint corren en paralelo. Los rombos marcan las fechas límite de las entregas de la URL.

Sprints y bloques

Sprint	Inicio	Fin	Bloques (uno por integrante)	Terminado cuando
1 · Investigación y propuesta	8 sep	9 oct	Investigación y hallazgos · Fundamentos y propuesta · Stack tecnológico · Cronograma	Terminado. Documento del Sprint 1 entregado.
2 · Base técnica y entrada a la app	Oct 13, 2026	Oct 26, 2026	Proyecto base, base de datos y despliegue (13 al 19 oct) · Diseño de pantallas y Santi · Alineación con la cámara · Bienvenida, idioma, ruta y zona	La app publicada lee de Supabase, las maquetas están aprobadas y se navega de la bienvenida a la cámara guardando idioma y ruta.
3 · Mapa de la fachada y gestor de fichas	Oct 27, 2026	Nov 9, 2026	Ilustración final de la fachada · Mapa interactivo con puntos y zoom · Gestor de fichas con aprobación · Modelo 3D provisional	Los 10 a 12 puntos se tocan y el progreso se guarda, una ficha se crea y se aprueba en el gestor, y el 3D provisional se abre en un Android de gama media.
4 · Recorrido completo de un punto	Nov 10, 2026	Nov 23, 2026	Confirmación y ficha del punto · Santi animado y narración · Gestor: ubicación de puntos, audios y publicación · Carga de las fichas recibidas	Cualquier punto se completa de principio a fin, Santi narra en los tres idiomas y un cambio aprobado en el gestor aparece en la app sin tocar código.

Sprint	Inicio	Fin	Bloques (uno por integrante)	Terminado cuando
5 · Historia en 3D, postal y accesibilidad	Jan 12, 2027	Jan 25, 2027	Modelo 3D final etiquetado · Pantalla “Ver cómo era” · Celebración y postal con Santi · Opciones de accesibilidad	El modelo pesa menos de 5 MB y lo aprueba investigación, la postal se comparte desde Android y las cuatro opciones de accesibilidad funcionan en todas las pantallas.
6 · Cierre, publicación y revisión final	Jan 26, 2027	Feb 8, 2027	Optimización de carga · Créditos y documentación · Despliegue a producción · Revisión final del producto	La app abre en menos de 3 s con 4G, la versión final está en línea con todo aprobado y el equipo aprueba la versión entregada.

Entregas del equipo de investigación (URL)

Tres entregas de la URL marcan el ritmo: si llegan tarde, la app avanza con contenido provisional que se reemplaza en el Sprint 6.

Qué entrega la URL	Fecha límite	Lo necesita
Foto de referencia de la fachada central y lista de puntos marcados sobre ella	Oct 26, 2026 (antes del Sprint 3)	Ilustración final y mapa interactivo (Sprint 3)
Fichas de la fachada central	Nov 9, 2026 (al cierre del Sprint 3)	Elegir los elementos del 3D (Sprint 3) y cargar las fichas en el gestor (Sprint 4)
Traducciones al kaqchikel y al inglés, y narraciones	Jan 11, 2027 (antes del Sprint 5)	Santi narrando y contenido en los tres idiomas (Sprints 5 y 6)

Supuestos y puntos por confirmar

- Los sprints duran 14 días, de martes a lunes, contados desde el cierre del Sprint 2 el lunes 26 de octubre.
- Diciembre queda libre: el trabajo se pausa del 24 de noviembre al 11 de enero y se retoma el martes 12 de enero de 2027. No se descontaron otros feriados.
- Dentro de cada sprint los cuatro bloques corren en paralelo. La excepción es el bloque de proyecto base del Sprint 2, en la primera semana, porque los demás trabajan encima de él.
- Falta definir qué integrante toma cada bloque en los Sprints 3 a 6.
- Fuera de estos 5 sprints quedan la fachada secundaria, el interior, el modo sin conexión y el piloto en sitio.
